

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 44 / 2025

Zeitraum	Datum:	27.10.2025 bis 02.11.2025		Kalenderwoche:	44/2025	Arbeitswoche:	31/2025
	Bauphase:	2 Wegscheide		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 11/5°C	 14/4°C	 20/1°C	 18/8°C	 15/5°C	 15/6°C	 12/8°C
Rückblick KW 44		<u>Allgemein:</u> -Dienstag, 28.10.2025 und Donnerstag, 30.10.2025; diverse Eigentümergespräche -Mittwoch, 29.10.2025; AVOR-Sitzung 2026 -Mittwoch, 29.10.2025; Bausitzung Nr. 22					
	1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt					
	2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Fertigstellungsarbeiten					
	2-2a	<u>Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz</u> -Abbruch- und Demontearbeiten -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Schmutzwasserleitung bis KS SW 421 -Grabenauffüllungen -Einbau Koffer					
	7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Anpassungen Vorplätze					
	7-1b	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Anpassungen Vorplätze -Einbau Deckbeläge Vorplätze					
	7-3b	<u>Brücke Hürbach Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -HDW-Abtrag Ufermauer -Fertigstellung Blockrampe Wasserbau -Versetzen Brückenplatte -Schalung und Bewehrung Schleppplatte und Schaufstösse					
	7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Trinkwasser-Hausanschluss					

Fotos



28.10.2025 / Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse/Planie



28.10.2025 / Wegscheide – Aushub- und Koffersersatz



28.10.2025 / Küchenfabrik – Aushub und Verlegen Meteorleitung




29.10.2025 / Hüribach – Vorbereitung Versetzen Brückenplatte



29.10.2025 / Küchenfabrik – Schalung und Bewehrung Mauer



30.10.2025 / Hüribach – Versetzen Brückenplatte 3

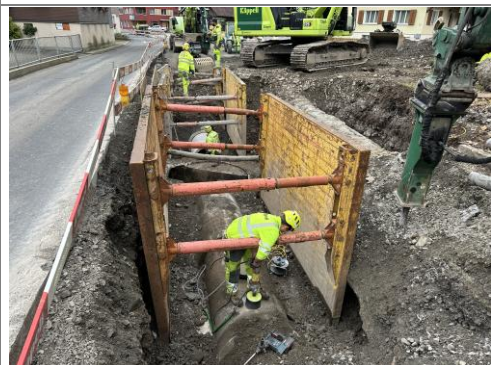

30.10.2025 / Wegscheide – Verlegen Schmutzwasserleitung



30.10.2025 / Hintere Brücke – Verlegen Trinkwasseranschluss

Ausblick KW 45+46

		Woche 45							Woche 46						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend)														
	Weid – Deckbelagsanpassung Projektanfang														
2-2a	Wegscheide – Belagsabbruch/Aushub														
	Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Wegscheide – Einbau Foundation														
	Wegscheide – Randabschlüsse														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
7-3b	Brücke Hüribach – Betonarbeiten Brücke														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
	Brücke Hüribach – Ufermauer														
7-4b	Hintere Brücke – Umgebungsmauer														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Einbau Foundation														

Verkehrsführung
KW 45

Bauphase 2-2a; Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
