

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 47 / 2025

Zeitraum

Datum:	17.11.2025 bis 23.11.2025	Kalenderwoche:	47/2025	Arbeitswoche:	34/2025
Bauphase:	2 Wagscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 10/4°C	 5/0°C	 4/-3°C	 4/0°C	 1/-1°C	 1/-4°C	 1/-7°C

Rückblick KW 47

	<u>Allgemein:</u> -Montag, Dienstag und Donnerstag; diverse Eigentümergespräche -Mittwoch, 19.11.2025; Fahrversuch AAGS Schützen-, Wil- und Marktstrasse -Freitag, 21.11.2025; Teileinstellung Baustelle aufgrund Schneefalls
1	<u>Brücke Bürgelbach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt
2-1b	<u>Trasse Weid-Wagscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Rückbau prov. Umfahrung und Installationsplatz -Fertigungsarbeiten
2-2a	<u>Trasse Wagscheide Fahrtrichtung Schwyz</u> -Einbau Koffer -Erstellen Roh- und Feinplanie -Versetzen Randabschlüsse -Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 1217 -Einbau Trag- und Deckbelag Trottoir -Vorarbeiten Vorplätze und Anpassungen
7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Erstellen Rohplanie -Anpassungen Vorplätze
7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Verkehrsumstellung -Einhausung Brücke -Kugelstrahlen, Siegel und PBD-Abdichtung aufbringen -Versetzen Randabschlüsse (kleben) -Blocksteine versetzen rechte Uferseite -Vorbeton erstellen linke Uferseite
7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau inkl. Kontrollschächte -Einbau Koffer -Umgebungsmauer KTN 91

Fotos



17.11.2025 / Küchenfabrik – Belagsabbruch Vorplätze



17.11.2025 / Adelmatt – Rückbau und Humusierung prov. Trasse




18.11.2025 / Hintere Brücke – Bewehrung Umgebungsmauer KTN 91



19.11.2025 / Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse



19.11.2025 / Wegscheide – Einbau Tragschicht Trottoir

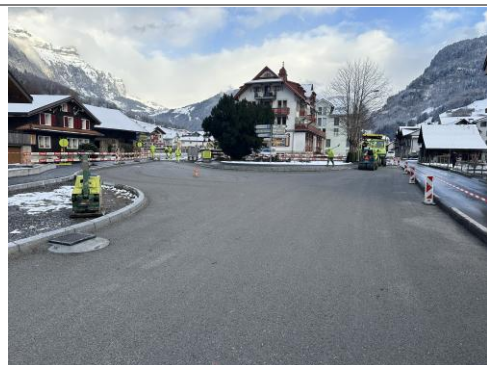

20.11.2025 / Wegscheide – Einbau Feinplanie



20.11.2025 / Hüribach – Versetzen



20.11.2025 / Hüribach – Kleben Randsteine und PBD-Abdichtung

Ausblick KW 48+49		Woche 48							Woche 49						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2a	Wegscheide – Belagsarbeiten														
	Wegscheide – Anpassungsarbeiten														
	Wegscheide – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Planie erstellen														
	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
	Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze														
	Küchenfabrik – Fertigstellungsarbeiten														
7-3a	Brücke Hüribach – Gussasphalt														
	Brücke Hüribach – Demontage Schutzzelt														
	Brücke Hüribach – Belagsarbeiten														
	Brücke Hüribach – linksseitige Ufermauern														
	Brücke Hüribach – rechtsseitige Ufermauern														
7-3b	Brücke Hüribach – Vorbereitungsarbeiten LM														
	Brücke Hüribach – Verkehrsumstellung														
7-4b	Hintere Brücke – Umgebungsmauer KTN 91														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Einbau Foundation														
	Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
	Hintere Brücke – Belagsarbeiten														

Verkehrsführung KW 48	Bauphase 2-2a; Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt
	Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- E. Aschwanden, GPL - J. Kolberg, PL KuBa	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister - B. Betschart, Brunnenmeister	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli
