

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 48 / 2025


Zeitraum	Datum:	24.11.2025 bis 30.11.2025	Kalenderwoche:	48/2025	Arbeitswoche:	35/2025
	Bauphase:	2 Wagscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 11/4°C	 4/2°C	 5/-2°C	 4/-5°C	 8/1°C	 8/1°C	 8/0°C

Rückblick KW 48

	<u>Allgemein:</u> -Dienstag, 25.11.2025; diverse Eigentümergespräche -Mittwoch, 26.11.2025; Bausitzung Nr. 24 -Mittwoch, 26.11.2025; Teileinstellung Baustelle (Schneefall)	
	1	<u>Brücke Bürgelbach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt
	2-2a	<u>Trasse Wagscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Erstellen Feinplanie -Versetzen Randabschlüsse -Sondage Fernwärmeleitung -Anpassungen Vorplatz Th. von Rickenbach inkl. Belagseinbau -Pflasterungen Rabatte Einlenker Schützenstrasse
	7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Einbau Koffer -Erstellen Feinplanie -Einbau Tragschicht und Deckbelag Trottoir -Anpassungen Vorplätze
	7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Einbau Gussasphalt -Einbau Belagsentwässerung inkl. Verfüllung -Einbau Binder- und Deckschicht -Demontage Schutzzelt -Demontage Installationsplattform -Blocksteine versetzen rechte Uferseite -Vorbeton erstellen linke Uferseite
	7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Einbau Koffer -Betonieren Umgebungsmauer KTN 91 -Querableitung Meteorwasserleitung

Fotos

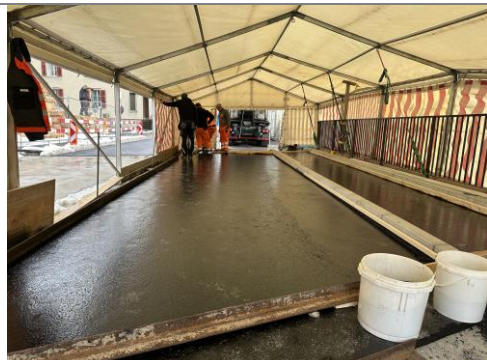

24.11.2025 / Hüribach – Einbau Gussasphalt Fahrs pur Schwyz



24.11.2025 / Wegscheide – Pflästerung Rabatte Schützenstrasse



25.11.2025 / Hintere Brücke – Querableitung Meteorleitung



26.11.2025 / Wegscheide – Teileinstellung Baustelle (Schneefall)



26.11.2025 / Hintere Brücke – Betonieren Umgebungsmauer KTN 91



28.11.2025 / Hüribach – Vergiessen Heissvergussfugen



28.11.2025 / Küchenfabrik – Einbau Deckbelag Trottoir



28.11.2025 / Wegscheide – Einbau Tragschicht Vorplatz KTN 629

Ausblick KW 49+50		Woche 49							Woche 50						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2a	Wegscheide – Belagsarbeiten														
	Wegscheide – Anpassungsarbeiten														
	Wegscheide – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
	Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze														
	Küchenfabrik – Fertigstellungsarbeiten														
7-3b	Brücke Hüribach – Verkehrsumstellung														
	Brücke Hüribach – Montage Schutzzelt														
	Brücke Hüribach – Abdichtungsarbeiten														
	Brücke Hüribach – Gussasphalt														
	Brücke Hüribach – Randabschlüsse														
	Brücke Hüribach – Vorbeton Ufermauern														
	Brücke Hüribach – HDW-Abtrag														
7-4b	Hintere Brücke – Einbau Koffer														
	Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
	Hintere Brücke – Einbau Planie														
	Hintere Brücke – Belagsarbeiten														
	Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten														
Verkehrsführung KW 49	Bauphase 2-2a; Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt													
	Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA													

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
