

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 12 / 2026

Zeitraum	Datum:	16.03.2026 bis 22.03.2026		Kalenderwoche:	12/2026	Arbeitswoche:	02/2026
	Bauphase:	2 Wegscheide		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 10/2°C	 12/2°C	 16/3°C	 12/0°C	 13/0°C	 12/0°C	 14/5°C
Rückblick KW 12		<u>Allgemein:</u> -Montag, 16.03.2026; Begehung Bezirk, Wasserbau u. Fischereiaufsicht bezüglich Hüribach -Donnerstag, 19.03.2026; Baustelle eingestellt (Feiertag)					
	2-2b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Schalung und Bewehrung Umgebungsmauer KTN 632 (M. Stürzl) -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschluss (KTN 632) -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Schalung und Bewehrung Brüstungsmauer Einfahrt Gängstrasse					
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Abbruch bestehende Treppe Restaurant Sternen -Rohplanie / Einbau Koffer -Versetzen prov. Kontrollschacht Trinkwasserleitung					
	5-1 / 5-2	<u>Trassee Knoten Klosterstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Einrichtung Installationsplätze					

Fotos



16.03.2026 / Wegscheid – Verlegen Werkleitungen inkl. Anschlüsse



18.03.2026 / Wegscheid – Verlegen Meteorleitung in Spriessung



18.03.2026 / Klosterstrasse – Einrichtung Installationsplätze




18.03.2026 / Klosterstrasse – Abbruch best. Treppe Rest. Sternen



18.03.2026 / Klosterstrasse – Aushub Fundationsschicht



20.03.2026 / Wegscheid – Schalung & Bewehrung Mauer KTN 632

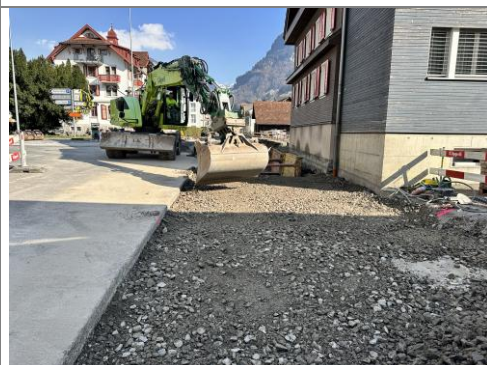

20.03.2026 / Wegscheid – Einbau Koffer



20.03.2026 / Wegscheid – Schalung Brüstungsmauer Gängstrasse

Ausblick KW 13+14

		Woche 13							Woche 14						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2b	Wegscheid – Werkleitungsbau														
	Wegscheid – Kofferersatz														
	Wegscheid – Versetzen Randabschlüsse														
	Wegscheid – Umgebungsmauer KTN 632														
	Wegscheid – Belagsarbeiten														
	Wegscheid – Anpassungsarbeiten														
3-1	Wegscheid-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheid-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheid-Hundeng. – Kofferersatz														
4-6	BHS Sternen – Abbrucharbeiten														
	BHS Sternen – Werkleitungsbau														
	BHS Sternen – Kofferersatz														
	BHS Sternen – Bushaltestelle FR Schwyz														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse – Bushaltestelle FR Hinterthal														

Verkehrsführung
KW 13

Bauphase 2-2b; Wegscheid	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Umleitung Schützenstrasse
Bauphase 3-1; Wegscheid-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.
