

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 30 / 2025

Zeitraum

Datum:	21.07.2025 bis 27.07.2025	Kalenderwoche:	30/2025	Arbeitswoche:	17/2025
Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 21/16°C	 23/15°C	 21/16°C	 18/16°C	 21/15°C	 17/15°C	 20/14°C

Rückblick KW 30

	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 23.07.2025, Bausitzung Nr. 13	
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Aufbringen Hessensiegel -Beginn Verlegen PBD-Abdichtung
		<u>Trassee Weid:</u> -Anpassung Bushaltestelle Weid FR Schwyz
	2-1a	<u>Trassee Weid-Wegscheide:</u> -Aushub und Verlegen Schmutzwasserleitung inkl. Kontrollschächte -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse und Schachtabdeckung
	6-1c	<u>Trassee Adelmatt (Bushaltestelle Säge FR Schwyz):</u> -Belag anschneiden -Abbruch Randabschlüsse
	6-2a	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Vorplatzarbeiten Privater -Feinplanie erstellen / Anstrich Randabschlüsse -Einbau Trag- und Binderschicht m 1505 bis 1650 -Einbau Tragschicht Trottoir -Hochziehen Schachtabdeckung
	7-1b	<u>Trassee Küchenfabrik:</u> -Sondage Schmutzwasserleitung inkl. Vorbereitung Hausanschlüsse -Trinkwasserleitung Hausanschlüsse vorbereiten (Leerrohre versetzen) -Einbau Koffer
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Abbruch Betonplatte und Widerlager -Aushub Widerlager -Unterfangung Strasse -Freilegen Pfahlbewehrung Widerlager Seite Schwyz

Fotos



21.07.2025 / Adelmatt – Einbau Planie und Anstrich Randabschlüsse



21.07.2025 / Hüribach– Abbruch Brückenplatte und Widerlager



23.07.2025 / Adelmatt – Einbau Binderschicht



23.07.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Fundationsschicht (Koffer)




25.07.2025 / Bürgelbach – Hessensiegel und Beginn PBD-Abdichtung



23.07.2025 / Weid-Wegscheide – Versetzen Randabschlüsse



25.07.2025 / Adelmatt BHS Säge – Abbruch Randsteine

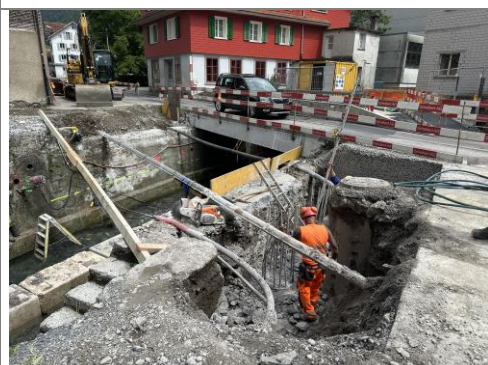

04.07.2025 / Hüribach – Aushub Widerlager / Freilegen Pfahlbewehr.

Ausblick KW 31+32

		Woche 31							Woche 32						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelb. – Abdichtungsarbeiten														
	Brücke Bürgelb. – Versetzen Randabschl.														
	Weid – Versetzen Randabschlüsse														
	Weid – Anpassungen														
2-1a	Weid – Auffüllung Werkleitungen														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
	Weid – Versetzen Randabschlüsse														
6-1c	Adelmatt BHS Säge - Aushub														
	Adelmatt BHS Säge – Versetzen Randsteine														
6-2a	Adelmatt – Belagsanpassungen bei KS														
	Adelmatt – Anrampungen														
	Adelmatt – Vorplätze privater														
7-1b	Küchenfabrik – Trasseeaushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Randabschlüsse														
7-3a	Brücke Hüribach – Aushub Widerlager														
	Brücke Hüribach – Start Betonarbeiten														
7-4a	Hintere Brücke – Signalisation														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch														

Verkehrsführung
KW 31

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 2-1a; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-1b; Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach-H. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE acht Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
