

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 36 / 2025

Zeitraum	Datum:	01.09.2025 bis 07.09.2025	Kalenderwoche:	36/2025	Arbeitswoche:	23/2025
	Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 20/14°C	 20/12°C	 20/12°C	 23/12°C	 16/13°C	 19/7°C	 21/8°C

Rückblick KW 36	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 03.09.2025; Bausitzung Nr. 18	
	1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Rückbau prov. Umfahrung und prov. Brücke
	2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Entfernung Hecken Parzelle KTN 1976 -Abbruch Umgebungsmauer -Belagsabbruch -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau -Einbau Koffer
	6-2b	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Vorbereitung Betonplatte
	7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte
	7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Betonieren Schlaufstoss -Betonieren Schleppplatten -Leitungsumlegung -Werkleitungsaushub / Sondagen
	7-4a	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau -Einbau Koffer -Vorbereitung Randabschlüsse

Fotos



03.09.2025 / Adelmatt – Versetzen Randsteine Bushaltestelle Säge



03.09.2025 / Weid-Wegscheide – Verlegen Kabelschutzrohre



03.09.2025 / Hüribach – Vorbereitung Schleppplatten



03.09.2025 / Bürgelbach – Rückbau prov. Brücke




05.09.2025 / Hintere Brücke – Vorbereitung Randabschlüsse



05.09.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Koffer



05.09.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau

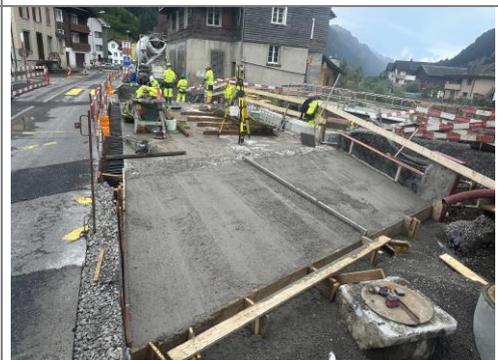

05.09.2025 / Hüribach – Betonieren Schleppplatten

Ausblick KW 37+38

		Woche 37							Woche 38						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung														
	Weid – div. Fertigstellungsarbeiten														
2-1b	Weid-Wegscheide – Abbruch/Aushub														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
	Weid-Wegscheide – Randabschlüsse														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
	Adelmatt BHS Säge – Belag Trottoir														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
7-3a	Brücke Hüribach – Brückenbau/Schleppplatten														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
	Brücke Hüribach – Einbau Foundation														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Einbau Foundation														
	Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
	Hintere Brücke – Einbau Belag														

Verkehrsführung
KW 37

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-1c/7-1a; Adelmatt-Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a/7-4a; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
