

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 39 / 2025

Zeitraum	Datum:	22.09.2025 bis 28.09.2025		Kalenderwoche:	39/2025	Arbeitswoche:	26/2025
	Bauphase:	2 Weid - Wegscheide		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 16/13°C	 15/13°C	 15/10°C	 14/10°C	 14/8°C	 13/7°C	 16/5°C
Rückblick KW 39		<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 24.09.2025; Signalisationsabnahme Bauphase 7-1a/7-3b/7-4b					
	1	<u>Brücke Bürgelbach:</u> -Rückbau prov. Umfahrung -Pflästerungen Bankette					
	2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau -Umgebungsmauer Parzelle KTN 1976 Schalen, bewehren und betonieren					
	7-1a	<u>Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte -Versetzen Randabschlüsse -Planie Trottoir -Einbau Tragschicht Einfahrt Parzelle 521					
	7-3b	<u>Brücke Hürbach Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Verkehrsumstellung -Belagsabbruch -Schneiden und Abbruch Brückenplatte -Abbruch Widerlager -Aushub Widerlager und Freilegen Pfähle Seite Hinterthal					
	7-4a	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Verkehrsumstellung -Schächte Anpassen					
	7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Verkehrsumstellung -Belagsabbruch					

Fotos



24.09.2025 / Weid-Wegscheide – Schalung Umgebungsmauer 1976



24.09.2025 / Küchenfabrik – Versetzen Randsteine Fahrbahn/Trottoir



24.09.2025 / Hüribach – Schneiden Brückenplatte



26.09.2025 / Weid – Rückbau provisorische Umfahrung




26.09.2025 / Weid-Wegscheide – Schalung und Betonieren Mauer



26.09.2025 / Weid – Pflasterung Bankett



26.09.2025 / Hüribach – Aushub Widerlager / Abbruch Brückenplatte

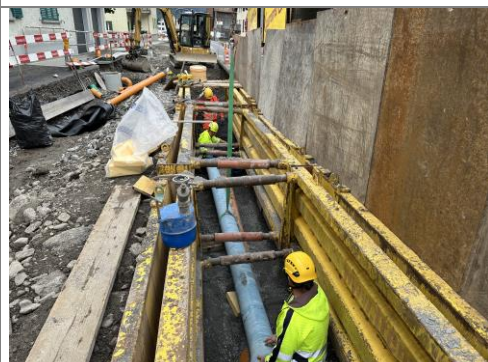

26.09.2025 / Küchenfabrik – Verlegen Trinkwasserleitung

Ausblick KW 40+41

		Woche 40							Woche 41						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung														
2-1b	Weid-Wegscheide – Aushub Werkleitungen														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
	Weid-Wegscheide – Randabschlüsse														
	Weid-Wegscheide – Umgebungsmauer														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Einbau Deckbelag														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Einbau Deckbelag														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Belagseinbau Trottoir														
7-3b	Brücke Hüribach – Aushub Widerlager														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsumlegung														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
	Brücke Hüribach – Widerlager														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
7-4b	Hintere Brücke – Umgebungsmauer														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung
KW 40

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
