

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 40 / 2025

Zeitraum	Datum: 29.09.2025 bis 05.10.2025		Kalenderwoche: 40/2025	Arbeitswoche: 27/2025			
	Bauphase: 2 Weid - Wegscheide		Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)				
	Bauphase: 6+7 Adelmatt - H. Brücke		Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)				
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 17/8°C	 16/8°C	 16/6°C	 12/5°C	 12/2°C	 15/8°C	 15/7°C
Rückblick KW 40		<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 01.10.2025; Bausitzung Nr. 20 -div. Grundeigentümergespräche					
	1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Rückbau prov. Umfahrung -Pflästerungen Bankette -Versetzen Randabschlüsse Fahrbahn/Rad-/Gehweg bei Bürgelibachbrücke Seite Schwyz					
	2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau inkl. Hausanschlüsse Trinkwasserleitung -Einbau Koffer -Anpassung Rabatte Th. von Rickenbach -Umgebungsmauer Parzelle KTN 1976 Schalen, bewehren und betonieren					
	7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse -Einbau Koffer -Erstellen Rohplanie Fahrbahn und Trottoir -Anpassungen Vorplätze					
	7-3b	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Umlegen LWL-Kabel -Aushub Widerlager -Freispitzen Pfahlbewehrung -Pfahlprüfungen -Installation und Start HDW-Abtrag Ufermauer Seite Hinterthal					
	7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch -Demontage und Abhängen bestehender Swisscom-Mast					

Fotos



30.09.2025 / Hürbach – Verlegen von Kabelschutzrohren




30.09.2025 / Hürbach – Aushub und Abbruch bestehende Brücke



30.09.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsbau



01.10.2025 / Weid – Schalung Umgebungsmauer KTN 1976

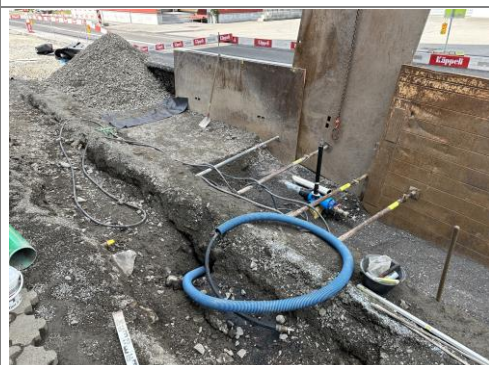

01.10.2025 / Weid – Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschluss



02.10.2025 / Küchenfabrik – Einbau Meteor- und Trinkwasserleitung



03.10.2025 / Hürbach – Freilegen Pfahlbewehrung / HDW-Abtrag



03.10.2025 / Küchenfabrik – Erstellen Rohplanie Fahrbahn + Trottoir

Ausblick KW 41+42

		Woche 41							Woche 42						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend)														
	Weid – Pflasterung Rabatte 1. Einfahrt Weid														
2-1b	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
	Weid-Wegscheide – Randabschlüsse														
	Weid-Wegscheide – Belagsarbeiten														
	Weid-Wegscheide – Umgebungsmauer														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Einbau Deckbelag														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Einbau Deckbelag														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Belagseinbau Trottoir														
7-3b	Brücke Hüribach – Betonarbeiten Widerlager														
	Brücke Hüribach – HDW-Abtrag Ufermauer														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
7-4b	Hintere Brücke – Umgebungsmauer														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung
KW 41

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
