

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 42 / 2025

Zeitraum	Datum:	13.10.2025 bis 19.10.2025	Kalenderwoche:	42/2025	Arbeitswoche:	29/2025
	Bauphase:	2 Weid - Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 14/9°C	 13/10°C	 12/9°C	 12/10°C	 13/8°C	 13/6°C	 13/3°C


Rückblick KW 42

	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 15.10.2025; Bausitzung Nr. 21 -Donnerstag, 16.10.2025, Besprechung Swisscom -Freitag, 17.10.2025, Begehung Bezirk/Wasserbau Hürbach -Freitag, 17.10.2025, Besprechung ebs (Kandelaber)
1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Rückbau prov. Umfahrung und IP sowie Rekultivierung -Einbau Deckbelag Rad-/Gehweg
2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Erstellen Roh- und Feinplanie Fahrbahn und Vorplatz G. Gwerder -Einbau Deckbelag Zufahrtsstrasse Neuhundenen und Vorplatz G. Gwerder -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn -Schächte hochziehen -Fertigstellungsarbeiten Umgebungsmauer Parzelle KTN 1976
6-1c	<u>Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Fugen vergiessen -Fertigstellung Bushaltestelle und Freigabe am Donnerstag, 16.10.2025
6-2b	<u>Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Fugen vergiessen -Fertigstellung Bushaltestelle und Freigabe am Donnerstag, 16.10.2025
7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse -Einbau Koffer -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn bis m 1680 -Erstellen Umgebungsmauer KTN 1211 -Anpassungen Vorplätze
7-3b	<u>Brücke Hürbach Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Schalung, Bewehrung und Betonieren Widerlager -Erstellen Blockrampe Wasserbau -Fertigstellung HDW-Abtrag Ufermauer Seite Schwyz
7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -keine Arbeiten ausgeführt

Fotos



13.10.2025 / Küchenfabrik – Verlegen Meteor- / Trinkwasserleitung

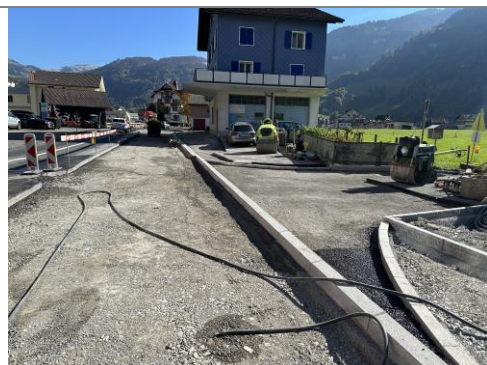

13.10.2025 / Weid-Wegscheide – Planie Fahrbahn/Vorplatz u. Einfahrt



13.10.2025 / Hüribach – Bewehrung Widerlager / HDW-Abtrag Mauer



15.10.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Tragschicht Fahrbahn



15.10.2025 / Küchenfabrik – Fundament Umgebungsmauer KTN 1211



16.10.2025 / Hüribach – Erstellen Blockrampe Sohle



17.10.2025 / Weid – Rekultivierung prov. Umfahrung



17.10.2025 / Weid – Einbau Deckbelag Rad-/Gehweg

Ausblick KW 43+44

		Woche 43							Woche 44						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend)														
	Weid – Deckbelagsanpassung Projektanfang														
	Weid – Markierungen														
2-1b	Weid-Wegscheide – Markierungen														
	Weid-Wegscheide – Fertigstellungsarbeiten														
	Weid-Wegscheide – Verkehrsumstellung														
2-2a	Wegscheide – Verkehrsumstellung														
	Wegscheide – Sondagen														
	Wegscheide – Belagsabbruch/Aushub														
	Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Wegscheide – Einbau Foundation														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Sondage Fernwärmeleitung														
7-3b	Brücke Hüribach – Betonarbeiten Brücke														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
7-4b	Hintere Brücke – Umgebungsmauer														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung
KW 43

Bauphase 2-1b; Weid - Wegscheide	Mo-Di: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 2-2a; Wegscheide	Di-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
