

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 27 / 2026

Zeitraum

Datum:	29.06.2026 bis 05.07.2026	Kalenderwoche:	27/2026	Arbeitswoche:	17/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 30/19°C	 32/18°C	 23/17°C	 27/12°C	 23/16°C	 25/14°C	 26/15°C

Rückblick KW 27

	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 01.07.2026, Bausitzung Nr. 35
3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundenengässli:</u> -Diverse Fertigstellungsarbeiten -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn bis Goldplanggstrasse -Anpassungen Vorplätze
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Malerarbeiten Fassade -Demontage Gerüst
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen -Anpassungen diverser Vorplätze -Rohplanie erstellen -Hinterfüllung Umgebungsmauern
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) -Trinkwasserleitung inkl. Hauszuleitungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Absteckung, Aushub und Versetzen Randabschlüssen inkl. Ausfugen -Anpassungen Vorplätze Privater
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau -Trinkwasserleitung inkl. Hauszuleitungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Randabschlüsse abstecken und versetzen

Fotos



30.06.2026 / Wegscheidi-Hundeneng. – Anpassung Vorplätze Privater



30.06.2026 / Bödeli – Abbruch best. Umgebungsmauer



01.07.2026 / Kloster-Wehistr. – Anpassung Vorplätze Privater




01.07.2026 / Klosterstrasse – Malen Fassade / Demontage Gerüst



01.07.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Einbau Koffer / Erstellen Rohplanie



01.07.2026 / Hundenengässli-Brämis – Werkleitungsbau

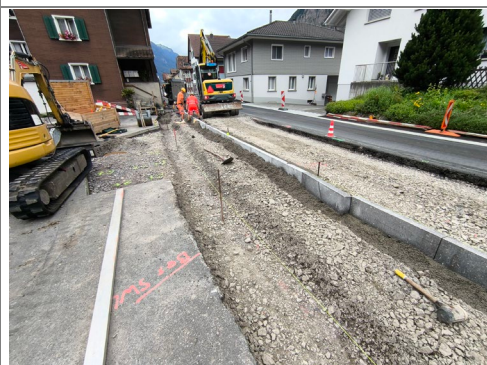

03.07.2026 / Bödeli. – Versetzen Randabschlüsse



03.07.2026 / Hundenengässli-Brämis – Abbruch Belag

Ausblick KW 28+29		Woche 28							Woche 29						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
4-1	Brämis-Poststrasse – Erstellen prov. Erschl.														
	Brämis-Poststrasse – Belagsabbruch														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau SWL														
5-1/5-2	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Belag Trottoir														
	Klosterstrasse – Belag Fahrbahn														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Anpassungen Vorplätze														
	Wehrstrasse – Rohplanie														
	Wehrstrasse – Belag Trottoir														
	Wehrstrasse – Belag Fahrbahn														
5-4	Denkmalstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmalstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmalstrasse – Kofferersatz														
	Denkmalstrasse – Anpassungen														
7-2a	Bödeli – Randabschlüsse														
	Bödeli – Rohplanie														
	Bödeli – Belag Fahrbahn und Anpassung														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Kofferersatz														
	Bödeli – Umgebungsmauern														
	Bödeli – Anpassungen														

Verkehrsführung
KW 28

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.
