

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 37 / 2025

Zeitraum

Datum:	08.09.2025 bis 14.09.2025	Kalenderwoche:	37/2025	Arbeitswoche:	24/2025
Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 21/11°C	 20/14°C	 19/14°C	 19/13°C	 16/13°C	 20/12°C	 21/14°C

Rückblick KW 37

	<u>Allgemein:</u> -keine Bemerkungen.
1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Rückbau prov. Umfahrung
2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse inkl. Bushaltestelle
6-1c	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Betonieren Betonplatte Bushaltestelle -Sicherstellung Zufahrt SPAR (Versetzen Stahlbleche)
6-2b	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Schalung und Bewehrung Betonplatte -Vorbereitung Betonarbeiten -Einbau Tragschicht Trottoir
7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte
7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Werkleitungsbau -Rohrmontage an Brückenaussenseite -Einbau Koffer
7-4a	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau -Einbau Koffer -Erstellen Rohplanie -Versetzen Randabschlüsse -Anpassung Swisscomschacht

Fotos



09.09.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsbau mit Spriessung




09.09.2025 / Hüribach – Rohrverlegung und Aufhängung an Brücke



09.09.2025 / Adelmatt – Einbau Tragschicht und Vorbereitung BHS



19.09.2025 / Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau und Einbau Koffer

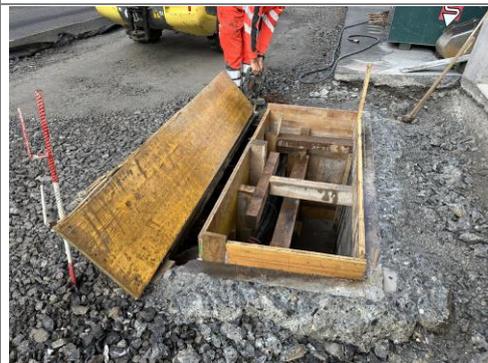

11.09.2025 / Hintere Brücke – Anpassung Swissschacht



11.09.2025 / Hintere Brücke – Randabschlüsse und Rohplanie



11.09.2025 / Weid-Wegscheide – Versetzen Randabschluss BHS



11.09.2025 / Adelmatt – Betonieren Bushaltestelle Säge FR Schwyz

Ausblick KW 38+39

		Woche 38							Woche 39						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung														
	Weid – div. Fertigstellungsarb. (Fugen/FZRS)														
2-1b	Weid-Wegscheide – Abbruch/Aushub														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
	Weid-Wegscheide – Randabschlüsse														
	Weid-Wegscheide – Betonplatte Bushaltest.														
	Weid-Wegscheide – Umgebungsmauer														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
7-3a	Brücke Hüribach – Einbau Foundation														
	Brücke Hüribach – Einbau Tragschicht														
	Brücke Hüribach – Rohrmontagen														
7-4a	Hintere Brücke – Einbau Foundation														
	Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
	Hintere Brücke – Einbau Trag-/Binderschicht														
	Hintere Brücke – Verkehrsumstellung														
7-4b	Hintere Brücke – Verkehrsumstellung														
	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung  
KW 38

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-1c/7-1a; Adelmatt-Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a/7-4a; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
