
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center"><b>Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</b></p>
 <p>WSP Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center"><b>Wochenjournal Bauarbeiten 2026</b></p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 12</p>	<p>Art: Wochenjournal</p>
<p>Woche / Jahr: KW 17-22 / 2026</p>	<p>Verfasser: R. Suter (BL)</p>
<p>Verteiler:</p>	<p>Verteiler:</p>
<p><b>x</b> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)  <b>x</b> N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)  <b>x</b> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)  <b>x</b> E. Betschart (Gde, Strassenmeister)  <b>x</b> M. Föhn (Gde, Schreiber)  <b>x</b> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)</p>	<p><b>x</b> M. Schelbert (Vertreter Anwohner)  <b>x</b> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG)  <b>x</b> H. Betschart (Bauführer Stv. Schelbert AG)  <b>x</b> G. Annen (WSP, PL / BL Stv.)  <b>x</b> A. Lifart (WSP, PL Stv. / BL Stv.)  <b>x</b> R. Suter (WSP, BL)</p>
<p>Stand der Arbeiten: <u>Teilstrecke 2 – Schönenboden bis Steinweid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitungsarbeiten (Schiften und Fräsen / Asphaltbewehrung, Haftvermittler und Kalkmilch auftragen etc.)</li> <li>• Deckbelagseinbau in Etappen (1 Etappe Steinweid / 2. Etappen Seeberg bis Mettlen, 3. Etappe Mettlen bis Laui, 4. Etappe Schönenboden bis EBS-Zentrale)</li> <li>• Kleinere Massnahmen (Belagsrigole, Sickerpackungen, Rinnen anpassen, Bankette anlegen, Fugen Brücken und Tunnel Laui etc.)</li> <li>• Ersatzmassnahme Laui: Schadenfall durch ausgerissene Bestockung und Einzäunung (Vandalismus). Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.</li> <li>• Die Vorabnahme der Teilstrecke 2 wurde am 19.05.2026 durchgeführt.</li> <li>• Die Abschlussarbeiten (Bankette anlegen, Humusieren) können demnächst abgeschlossen werden.</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 2 – Gigenbachbrücken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbreiterung Fahrbahn Brücken: Leitschranken im Bereich der Gigenbachbrücken wurden an die Aussenseite der Randborde versetzt, der Belag ist auf dem Randbord leicht überbaut.</li> </ul> <p><u>Verkehrsführung bis Ende April 2026</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgeführte Vollsperrungen im April 2026: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donnerstag, 17. April 2026 (Einbau Deckbelag Steinweid)</li> <li>- Dienstag, 21. April 2026 (Einbau Deckbelag, Seeberg-Mettlen)</li> <li>- Mittwoch, 24. April 2026 (Einbau Deckbelag, Mettlen bis Laui)</li> <li>- Dienstag, 28. April 2026 (Einbau Deckbelag Schönenboden bis EBS-Zentrale)</li> </ul> </li> <li>• Der Wanderweg ins Bisisthal ist geöffnet</li> <li>• Der Bus der AAGS fährt im Normalbetrieb gem. Fahrplan</li> <li>• Die letzte Sperrung der Bisisthalerstrasse wurde am 28. April 2026 durchgeführt, die Abschlussarbeiten erfolgen unter Verkehr</li> </ul>	



**TS 2 am 20.04.2026: Auftrag Haftvermittler und Kalkmilch vor Deckbelagseinbau im Bereich Mettlen bis Seeberg.**




**TS 2 am 21.04.2026: Deckbelagseinbau im Bereich Seeberg bis Mettlen.**



**TS 2 am 21.04.2026: Deckbelagseinbau im Bereich der unteren Gigenbachbrücke. Der Belag ist bündig mit Oberkant Randbord resp. leicht überbaut.**



**TS 2 am 23.04.2026: Vorbereitungsarbeiten vor Deckbelagseinbau wie z.B. Asphaltbewehrung bei Fugen in Tragschicht anbringen.**

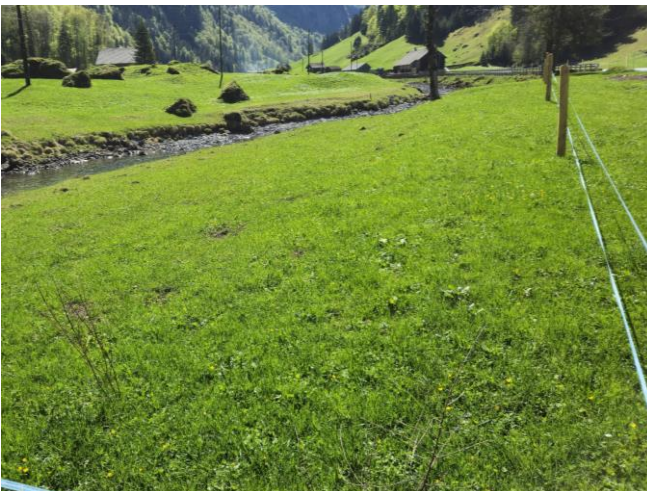

**TS 2 am 24.04.2026: Die Bestockung (Ersatzaufforstung) in der Laui, welche durch die Schule mit der Gemeinde angelegt wurde, ist durch Unbekannte ausgerissen worden.**



**TS 2 am 24.04.2026: Deckbelagseinbau im Bereich Seeberg bis Mettlen.**



**TS 2 am 27.04.2026: Vorbereitungsarbeiten für Deckbelag im Bereich Schönenboden bis EBS-Zentrale Seeberg; Asphaltbewehrung kleben und Haftvermittler aufspritzen.**



**TS 2 am 28.04.2026: Deckbelagseinbau Schönenboden bis EBS-Zentrale.**



**TS 2 am 19.05.2026: Vorabnahme Teilstrecke 2: Obere Gigenbachbrücke.**



**TS 2 am 19.05.2026: Vorabnahme Teilstrecke 2: Sickerpackung bergseitig und Kiesbankett im Bereich Seeberg.**
